KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4, MENTAOS, BANJARBARU UTARA, KOTA BANJARBARU 70714
TELEPON. (0511) 4772346, FAXIMILI (0511) 4781810
WEBSITE : www.kalsel.brmp.pertanian.go.id

LAPORAN MINGGUAN
&
HARIAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nomor Kontrak ;
Nomor : B-162/PL.020/H.12.26/04/2026

Nama Paket Pekerjaan :
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Ruang AOR
BRMP Kalimantan Selatan

Lokasi Pekerjaan ;
Jalan Panglima Batur Barat No. 4 Mentaos Banjarbaru Utara

Tahun Anggaran 2026

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. SATRIA ADITYATAMA
BANJARBARU
BANK BPD Kalsel. Cab. Banjarbaru
NPWP 03.108.399.0-732.000
Jl. Hercules Km. 25 No. 13 RT. 002 RW. 007 Landasan Ulin Timur Banjarbaru 70724 Telp. (0511) 7676603
Akte Notaris : Noor Hasanah, SH. No. 299 Tgl. 14 Juli 2010

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN	MINGGU KE : I (Satu) TANGGAL : 8 s/d 14 April 2026

KEMENTERIAN PERTANIAN

INSTANSI	: BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
PEKERJAAN	: PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR BRMP KALIMANTAN SELATAN
LOKASI	: JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS, BANJARBARU UTARA
NOMOR KONTRAK	: B-162/PL.020/H.12.26/04/2026, TANGGAL 08 APRIL 2026
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)	: B-163/PL.020/H.12.26/04/2026, TANGGAL 08 APRIL 2026
NILAI KONTRAK	: Rp. 106.004.001,00
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. SATRIA ADITYATAMA
KONSULTAN PENGAWAS	:
WAKTU PELAKSANAAN	: 35 (TIGA PULUH LIMA) HARI KALENDER
SERAH TERIMA	: 12 MEI 2026
SUMBER DANA	: APBN DIPA-018.09.2.634015/2026
TAHUN ANGGARAN	: TAHUN 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME SATUAN	BOBOT PEK. (%)	TAHAP PENYELESAIAN PEKERJAAN (%)	TIAP BAGIAN TERHADAP SELURUH PEKERJAAN (%)
I.	**PEKERJAAN LAPIS DINDING PEREDAM,**				
1	Pek. dinding Lapis Glasswool Density 60 kg/m3 dan rangka Plywood 15mm	65.52 M²	26.41	75.00	19.81
2	Pek. Lapis Dinding dengan Multiplek Meranti 9mm, Lapis HPL Motif dan Plat Mirror	65.52 M²	51.42	25.00	12.86
3	Pek. Buat Lemari Playwood 15mm lapis HPL + lampu strip	3.00 M²	3.76	0.00	0.00
4	Pek. Buat Pintu Dobel Playwood 15mm lapis HPL, lapis Peredam + Aksesorinya	1.00 Bh	2.30	0.00	0.00
II.	**PEKERJAAN PLAFOND**				
1	Pek. Pemasangan Rangka Plafond Hollo Metal Furing 4x4 dan 2x4	30.00 M²	4.62	0.00	0.00
2	Pek. Pemasangan Plafond Gypsum Board tbl 9mm	30.00 M²	2.50	0.00	0.00
3	Pek. Cat catan Plafond Gypsum Board	30.00 M²	0.90	0.00	0.00
4	Pek. Pasangan Instalsi Listrik dan Lampu Downlight 15 Watt	5.00 Titik	0.26	0.00	0.00
III.	**PEKERJAAN LAPIS LANTAI VINYL**				
1	Pek. Melapis Lantai dengan VINYL Motif Kayu + Accessorisnya	30.00 M²	7.84	0.00	0.00
A	**JUMLAH PERSENTASE**		**100.00**		**32.67**

TINGKAT PENYELESAIAN PEKERJAAN MENCAPAI **32.67** %

TERBILANG : TIGA PULUH DUA KOMA ENAM PULUH TUJUH PERSEN

KETERANGAN :

MENURUT TIME SCHEDULE :	13.52 %	**KEMAJUAN PEK. MINGGU INI**	32.67 %
PROGRESS REALISASI FISIK :	32.67 %	**KEMAJUAN PEK. MINGGU LALU**	0.00 %
DEVIASI MAJU/TERLAMBAT :	19.15 %	**KEMAJUAN PEK. PERMINGGU**	32.67 %

Mengetahui;
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

IDA FARIDATUL ALAWIYAH, SST
Nip. 199610102019022001

Dibuat Oleh;
Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU

SRI SUHARSIH
Direktris

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN	MINGGU KE : II (Dua) TANGGAL : 15 s/d 21 April 2026

KEMENTERIAN PERTANIAN

INSTANSI	: BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
PEKERJAAN	: PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR BRMP KALIMANTAN SELATAN
LOKASI	: JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS, BANJARBARU UTARA
NOMOR KONTRAK	: B-162/PL.020/H.12.26/04/2026, TANGGAL 08 APRIL 2026
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)	: B-163/PL.020/H.12.26/04/2026, TANGGAL 08 APRIL 2026
NILAI KONTRAK	: Rp. 106.004.001,00
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. SATRIA ADITYATAMA
KONSULTAN PENGAWAS	:
WAKTU PELAKSANAAN	: 35 (TIGA PULUH LIMA) HARI KALENDER
SERAH TERIMA	: 12 MEI 2026
SUMBER DANA	: APBN DIPA-018.09.2.634015/2026
TAHUN ANGGARAN	: TAHUN 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME SATUAN	BOBOT PEK. (%)	TAHAP PENYELESAIAN PEKERJAAN (%)	TIAP BAGIAN TERHADAP SELURUH PEKERJAAN (%)
I.	**PEKERJAAN LAPIS DINDING PEREDAM,**				
1	Pek. dinding Lapis Glasswool Density 60 kg/m3 dan rangka Plywood 15mm	65.52 M²	26.41	100.00	26.41
2	Pek. Lapis Dinding dengan Multiplek Meranti 9mm, Lapis HPL Motif dan Plat Mirror	65.52 M²	51.42	55.00	28.28
3	Pek. Buat Lemari Playwood 15mm lapis HPL + lampu strip	3.00 M²	3.76	25.00	0.94
4	Pek. Buat Pintu Dobel Playwood 15mm lapis HPL, lapis Peredam + Aksesorinya	1.00 Bh	2.30	0.00	0.00
II.	**PEKERJAAN PLAFOND**				
1	Pek. Pemasangan Rangka Plafond Hollo Metal Furing 4x4 dan 2x4	30.00 M²	4.62	100.00	4.62
2	Pek. Pemasangan Plafond Gypsum Board tbl 9mm	30.00 M²	2.50	100.00	2.50
3	Pek. Cat catan Plafond Gypsum Board	30.00 M²	0.90	0.00	0.00
4	Pek. Pasangan Instalsi Listrik dan Lampu Downlight 15 Watt	5.00 Titik	0.26	50.00	0.13
III.	**PEKERJAAN LAPIS LANTAI VINYL**				
1	Pek. Melapis Lantai dengan VINYL Motif Kayu + Accessorisnya	30.00 M²	7.84	0.00	0.00
A	**JUMLAH PERSENTASE**		**100.00**		**62.88**

TINGKAT PENYELESAIAN PEKERJAAN MENCAPAI **62.88** %

TERBILANG : ENAM PULUH DUA KOMA DELAPAN PULUH DELAPAN PERSEN

KETERANGAN :

MENURUT TIME SCHEDULE :	52.84 %	**KEMAJUAN PEK. MINGGU INI**	62.88 %
PROGRESS REALISASI FISIK :	62.88 %	**KEMAJUAN PEK. MINGGU LALU**	32.67 %
DEVIASI MAJU/TERLAMBAT :	10.04 %	**KEMAJUAN PEK. PERMINGGU**	30.21 %

Mengetahui;
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

IDA FARIDATUL ALAWIYAH, SST
Nip. 199610102019022001

Dibuat Oleh;
Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU

SRI SUHARSIH
Direktris

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN	MINGGU KE : III (Tiga) TANGGAL : 22 s/d 28 April 2026

KEMENTERIAN PERTANIAN

INSTANSI	: BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
PEKERJAAN	: PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR BRMP KALIMANTAN SELATAN
LOKASI	: JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS, BANJARBARU UTARA
NOMOR KONTRAK	: B-162/PL.020/H.12.26/04/2026, TANGGAL 08 APRIL 2026
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)	: B-163/PL.020/H.12.26/04/2026, TANGGAL 08 APRIL 2026
NILAI KONTRAK	: Rp. 106.004.001,00
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. SATRIA ADITYATAMA
KONSULTAN PENGAWAS	:
WAKTU PELAKSANAAN	: 35 (TIGA PULUH LIMA) HARI KALENDER
SERAH TERIMA	: 12 MEI 2026
SUMBER DANA	: APBN DIPA-018.09.2.634015/2026
TAHUN ANGGARAN	: TAHUN 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME SATUAN	BOBOT PEK. (%)	TAHAP PENYELESAIAN PEKERJAAN (%)	TIAP BAGIAN TERHADAP SELURUH PEKERJAAN (%)
I.	**PEKERJAAN LAPIS DINDING PEREDAM,**				
1	Pek. dinding Lapis Glasswool Density 60 kg/m3 dan rangka Plywood 15mm	65.52 M²	26.41	100.00	26.41
2	Pek. Lapis Dinding dengan Multiplek Meranti 9mm, Lapis HPL Motif dan Plat Mirror	65.52 M²	51.42	100.00	51.42
3	Pek. Buat Lemari Playwood 15mm lapis HPL + lampu strip	3.00 M²	3.76	45.00	1.69
4	Pek. Buat Pintu Dobel Playwood 15mm lapis HPL, lapis Peredam + Aksesorinya	1.00 Bh	2.30	25.00	0.58
II.	**PEKERJAAN PLAFOND**				
1	Pek. Pemasangan Rangka Plafond Hollo Metal Furing 4x4 dan 2x4	30.00 M²	4.62	100.00	4.62
2	Pek. Pemasangan Plafond Gypsum Board tbl 9mm	30.00 M²	2.50	100.00	2.50
3	Pek. Cat catan Plafond Gypsum Board	30.00 M²	0.90	100.00	0.90
4	Pek. Pasangan Instalsi Listrik dan Lampu Downlight 15 Watt	5.00 Titik	0.26	100.00	0.26
III.	**PEKERJAAN LAPIS LANTAI VINYL**				
1	Pek. Melapis Lantai dengan VINYL Motif Kayu + Accessorisnya	30.00 M²	7.84	75.00	5.88
A	**JUMLAH PERSENTASE**		**100.00**		**94.25**

TINGKAT PENYELESAIAN PEKERJAAN MENCAPAI **94.25** %

TERBILANG : SEMBILAN PULUH EMPAT KOMA DUA PULUH LIMA PERSEN

KETERANGAN :

MENURUT TIME SCHEDULE :	93.68 %	**KEMAJUAN PEK. MINGGU INI**	94.25 %
PROGRESS REALISASI FISIK :	94.25 %	**KEMAJUAN PEK. MINGGU LALU**	62.88 %
DEVIASI MAJU/TERLAMBAT :	0.57 %	**KEMAJUAN PEK. PERMINGGU**	31.37 %

Mengetahui;
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

IDA FARIDATUL ALAWIYAH, SST
Nip. 199610102019022001

Dibuat Oleh;
Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU

SRI SUHARSIH
Direktris

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN	MINGGU KE : IV (Empat) TANGGAL : 29 April s/d 05 Mei 2026

KEMENTERIAN PERTANIAN

INSTANSI	: BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
PEKERJAAN	: PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR BRMP KALIMANTAN SELATAN
LOKASI	: JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS, BANJARBARU UTARA
NOMOR KONTRAK	: B-162/PL.020/H.12.26/04/2026, TANGGAL 08 APRIL 2026
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)	: B-163/PL.020/H.12.26/04/2026, TANGGAL 08 APRIL 2026
NILAI KONTRAK	: Rp. 106.004.001,00
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. SATRIA ADITYATAMA
KONSULTAN PENGAWAS	:
WAKTU PELAKSANAAN	: 35 (TIGA PULUH LIMA) HARI KALENDER
SERAH TERIMA	: 12 MEI 2026
SUMBER DANA	: APBN DIPA-018.09.2.634015/2026
TAHUN ANGGARAN	: TAHUN 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME SATUAN	BOBOT PEK. (%)	TAHAP PENYELESAIAN PEKERJAAN (%)	TIAP BAGIAN TERHADAP SELURUH PEKERJAAN (%)
I.	**PEKERJAAN LAPIS DINDING PEREDAM,**				
1	Pek. dinding Lapis Glasswool Density 60 kg/m3 dan rangka Plywood 15mm	65.52 M²	26.41	100.00	26.41
2	Pek. Lapis Dinding dengan Multiplek Meranti 9mm, Lapis HPL Motif dan Plat Mirror	65.52 M²	51.42	100.00	51.42
3	Pek. Buat Lemari Playwood 15mm lapis HPL + lampu strip	3.00 M²	3.76	100.00	3.76
4	Pek. Buat Pintu Dobel Playwood 15mm lapis HPL, lapis Peredam + Aksesorinya	1.00 Bh	2.30	100.00	2.30
II.	**PEKERJAAN PLAFOND**				
1	Pek. Pemasangan Rangka Plafond Hollo Metal Furing 4x4 dan 2x4	30.00 M²	4.62	100.00	4.62
2	Pek. Pemasangan Plafond Gypsum Board tbl 9mm	30.00 M²	2.50	100.00	2.50
3	Pek. Cat catan Plafond Gypsum Board	30.00 M²	0.90	100.00	0.90
4	Pek. Pasangan Instalsi Listrik dan Lampu Downlight 15 Watt	5.00 Titik	0.26	100.00	0.26
III.	**PEKERJAAN LAPIS LANTAI VINYL**				
1	Pek. Melapis Lantai dengan VINYL Motif Kayu + Accessorisnya	30.00 M²	7.84	100.00	7.84
A	**JUMLAH PERSENTASE**		**100.00**		**100.00**

TINGKAT PENYELESAIAN PEKERJAAN MENCAPAI 100.00 %

TERBILANG : SERATUS PERSEN

KETERANGAN :

MENURUT TIME SCHEDULE :	100.00 %	**KEMAJUAN PEK. MINGGU INI**	100.00 %
PROGRESS REALISASI FISIK :	100.00 %	**KEMAJUAN PEK. MINGGU LALU**	94.25 %
DEVIASI MAJU/TERLAMBAT :	0.00 %	**KEMAJUAN PEK. PERMINGGU**	5.75 %

Mengetahui;
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

IDA FARIDATUL ALAWIYAH, SST
Nip. 199610102019022001

Dibuat Oleh;
Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU

SRI SUHARSIH
Direktris

JADWAL PELAKSANAAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR BRMP KALIMANTAN SELATAN
LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS, BANJARBARU UTARA

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	WAKTU PELAKSANAAN 35 HARI KALENDER				KET.
			I	II	III	IV	
I.	PEKERJAAN LAPIS DINDING PEREDAM,						100%
	1. Pek. dinding Lapis Glasswool Density 60 kg/m3 dan rangka Plywood 15mm	26.41	8.80	8.80	8.80		
	2. Pek. Lapis Dinding dengan Multiplek Meranti 9mm, Lapis HPL Motif dan Plat Mirror	51.42		25.71	25.71		
	3. Pek. Buat Lemari Playwood 15mm lapis HPL + lampu strip	3.76		1.25	1.25	1.25	
	4. Pek. Buat Pintu Dobel Playwood 15mm lapis HPL, lapis Peredam + Aksesorinya	2.30			1.15	1.15	
II.	PEKERJAAN PLAFOND						
	1. Pek. Pemasangan Rangka Plafond Hollo Metal Furing 4x4 dan 2x4	4.62	2.31	2.31			50%
	2. Pek. Pemasangan Plafond Gypsum Board tbl 9mm	2.50	1.25	1.25			
	3. Pek. Cat catan Plafond Gypsum Board	0.90	0.90				
	4. Pek. Pasangan Instalsi Listrik dan Lampu Downlight 15 Watt	0.26	0.26				
III.	PEKERJAAN LAPIS LANTAI VINYL						
	1. Pek. Melapis Lantai dengan VINYL Motif Kayu + Accessorisnya	7.84			3.92	3.92	0%
	JUMLAH PERSENTASE	**100.00**					
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN (%)		13.52	39.32	40.84	6.32	
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN KOMULATIF (%)		13.52	52.84	93.68	100.00	
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN KOMULATIF (%)		32.67	62.88	94.25	100.00	
	DEVIASI		19.15	10.04	0.57	0.00	



Mengetahui;
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

IDA FARIDATUL ALAWIYAH, SST
Nip. 199610102019022001

Dibuat Oleh;
Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

CV. SATRIA ADITYATAMA
BANJARBARU

SRI SUHARSIH
Direktris

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU : I (SATU)

TANGGAL : 08 s/d 14 APRIL 2026

KEMENTERIAN PERTANIAN

INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN
LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA
NO. KONTRAK : B-162/PL.020/H.12.26/04/2026, TANGGAL 08 APRIL 2026
KONTRAKTOR PELAKSANA : **CV. SATRIA ADITYATAMA**
NILAI KONTRAK : Rp. 106.004.001,00
WAKTU PELAKSANAAN : 35 (TIGA PULUH LIMA) HARI KALENDER

HARI		RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA
CUACA	BAIK	√	√	√	√	√	√	√
	HUJAN							
JUMLAH JAM KERJA		8	8	8	8	8	8	8
1.	SITE MANAGER							
2.	PELAKSANA	1	1	1	1		1	1
3.	MANDOR	1	1	1	1		1	1
4.	LOGISTIK/ADMINISTRASI							
5.	KEPALA TUKANG							
6.	TUKANG BATU							
7.	TUKANG KAYU	2	2					
8.	TUKANG CAT							
9.	TUKANG INTERIOR	3	3	3	3		3	3
10	TUKANG BESI							
11	TUKANG LISTRIK							
12	PEMBANTU TUKANG							
13	KEAMANAN PROYEK							
	JUMLAH	7	7	5	5	-	5	5

Dibuat oleh :
Nama : NOVI RATNASARI
Jabatan : PELAKSANA
Kontraktor : CV. SATRIA ADITYATAMA

CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU

T.Tangan : .....

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : RABU Tgl : 08 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu	2	Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	7	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1	Plywood 15mm Meranti	6	Lembar
2	Plywood 9mm Meranti	25	Lembar
3	Gypsum board 9mm	15	Lembar
4	Paku tembak F25 Air Nail	1	Kotak
5	Holo 4x4	15	batang
6	Holo 2x4	20	batang
7	SEKRUP 1.1/4	1	Kotak
8	SEKRUP 1.1/2	1	Kotak
9	Glasswool/Rockwool	6	Rol
10	LEM TACO	10	Kg
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PEMBONGKARAN PLAFOND LAMA

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : KAMIS Tgl : 09 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu	2	Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	7	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PEMBONGKARAN PLAFOND LAMA

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : JUM'AT Tgl : 10 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	5	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PEMBUATAN RANGKA DINDING PEREDAM PLYWOOD 15MM

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : SABTU Tgl : 11 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	5	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PEMBUATAN RANGKA DINDING PEREDAM PLYWOOD 15MM

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : MINGGU Tgl : 12 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana		Orang
3	Mandor		Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR		Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	-	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

Tidak Ada Kegitan

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : SENIN Tgl : 13 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	5	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PASANGAN RANGKA PEREDAM PLYWOOD 15MM
- PEKERJAAN PASANGAN GLASS WOOL PEREDAM

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : SELASA Tgl : 14 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	5	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PASANGAN RANGKA PEREDAM PLYWOOD 15MM
- PEKERJAAN PASANGAN GLASS WOOL PEREDAM

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU : II (DUA)

TANGGAL : 15 s/d 21 APRIL 2026

KEMENTERIAN PERTANIAN

INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN
LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA
NO. KONTRAK : B-162/PL.020/H.12.26/04/2026, TANGGAL 08 APRIL 2026
KONTRAKTOR PELAKSANA : **CV. SATRIA ADITYATAMA**
NILAI KONTRAK : Rp. 106.004.001,00
WAKTU PELAKSANAAN : 35 (TIGA PULUH LIMA) HARI KALENDER

HARI		RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA
CUACA	BAIK	√	√	√	√	√	√	√
	HUJAN							
JUMLAH JAM KERJA		8	8	8	8	8	8	8
1.	SITE MANAGER							
2.	PELAKSANA	1	1	1	1		1	1
3.	MANDOR	1	1	1	1		1	1
4.	LOGISTIK/ADMINISTRASI							
5.	KEPALA TUKANG							
6.	TUKANG BATU				4		4	
7.	TUKANG KAYU							2
8.	TUKANG CAT							
9.	TUKANG INTERIOR	3	3	3				
10	TUKANG BESI							
11	TUKANG LISTRIK				1		1	
12	PEMBANTU TUKANG							
13	KEAMANAN PROYEK							
	JUMLAH	5	5	5	7	-	7	4

Dibuat oleh :
Nama : NOVI RATNASARI
Jabatan : PELAKSANA
Kontraktor : CV. SATRIA ADITYATAMA

CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU

T.Tangan : .....

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : RABU Tgl : 15 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	5	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PASANGAN GLASS WOOL PEREDAM
- PEKERJAAN PASANGAN PLYWOOD 9MM

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : KAMIS Tgl : 16 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	5	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PASANGAN GLASS WOOL PEREDAM
- PEKERJAAN PASANGAN PLYWOOD 9MM

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : JUM'AT Tgl : 17 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	5	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PASANGAN GLASS WOOL PEREDAM
- PEKERJAAN PASANGAN PLYWOOD 9MM

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : SABTU Tgl : 18 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu	4	Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR		Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik	1	Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	7	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PASANGAN RANGKA PLAFOND HOLLO
- PEKERJAAN PASANGAN INSTALASI LISTRIK LAMPU

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : MINGGU Tgl : 19 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana		Orang
3	Mandor		Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR		Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	-	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

Tidak Ada Kegitan

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : SENIN Tgl : 20 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu	4	Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR		Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik	1	Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	7	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PASANGAN RANGKA PLAFOND HOLLO
- PEKERJAAN PASANGAN PLAFOND GYPSUM BOARD 9MM

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : SELASA Tgl : 21 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu	2	Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR		Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	4	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1	Plywood 15mm Meranti	2	Lembar
2	Plywood 9mm Meranti	10	Lembar
3	LEM TACO	10	Kg
4	Glasswool	3	Rol
5	Sekrup	2	Kotak
6	HPL TH 371 H (Smoke Picaila)	8	Lembar
7	HPL TH 134 AA (Dawn Concord)	5	Lembar
8	HPL TH 133 AA (Mahight Concord)	1	Lembar
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN COMPOUND PLAFOND GYPSUM

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU : III (TIGA)

TANGGAL : 22 s/d 28 APRIL 2026

KEMENTERIAN PERTANIAN

INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN
LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA
NO. KONTRAK : B-162/PL.020/H.12.26/04/2026, TANGGAL 08 APRIL 2026
KONTRAKTOR PELAKSANA : **CV. SATRIA ADITYATAMA**
NILAI KONTRAK : Rp. 106.004.001,00
WAKTU PELAKSANAAN : 35 (TIGA PULUH LIMA) HARI KALENDER

HARI		RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA
CUACA	BAIK	√	√	√	√	√	√	√
	HUJAN							
JUMLAH JAM KERJA		8	8	8	8	8	8	8
1.	SITE MANAGER							
2.	PELAKSANA	1	1	1	1		1	1
3.	MANDOR	1	1	1	1		1	1
4.	LOGISTIK/ADMINISTRASI							
5.	KEPALA TUKANG							
6.	TUKANG BATU							
7.	TUKANG KAYU							
8.	TUKANG CAT							
9.	TUKANG INTERIOR	3	3	3	3		3	3
10	TUKANG BESI							
11	TUKANG LISTRIK							
12	PEMBANTU TUKANG							
13	KEAMANAN PROYEK							
	JUMLAH	5	5	5	5	-	5	5

Dibuat oleh :
Nama : NOVI RATNASARI
Jabatan : PELAKSANA
Kontraktor : CV. SATRIA ADITYATAMA

CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU

T.Tangan : .....

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : RABU Tgl : 22 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	5	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1	LEM TACO	10	Kg
2	Sekrup	2	Kotak
3	HPL TH 371 H (Smoke Picaila)	5	Lembar
4	HPL TH 134 AA (Dawn Concord)	5	Lembar
5	HPL TH 133 AA (Mahight Concord)	1	Lembar
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PASANGAN HPL

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : KAMIS Tgl : 23 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	5	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PASANGAN HPL
- PEKERJAAN PEMBUATAN RANGKA LIS BAN ATAS DAN BAWAH

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : JUM'AT Tgl : 24 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	5	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PASANGAN HPL
- PEKERJAAN PEMBUATAN RANGKA LIS BAN ATAS DAN BAWAH

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : SABTU Tgl : 25 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	5	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PASANGAN HPL
- PEKERJAAN PEMBUATAN RANGKA LIS BAN ATAS DAN BAWAH

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : MINGGU Tgl : 26 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana		Orang
3	Mandor		Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR		Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	-	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

Tidak Ada Kegitan

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : SENIN Tgl : 27 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	5	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1	LEM TACO	10	Kg
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PASANGAN HPL
- PEKERJAAN PEMBUATAN RANGKA LIS BAN ATAS DAN BAWAH

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

LAPORAN HARIAN

LEMBAR :

Kontraktor Pelaksana

CV. SATRIA ADITYATAMA

INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN

LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA

Hari : SELASA

Tgl : 28 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	5	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PASANGAN LIS BAN BANAN

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU : IV (EMPAT)

TANGGAL : 29 s/d 05 APRIL 2026

KEMENTERIAN PERTANIAN

INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN
LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA
NO. KONTRAK : B-162/PL.020/H.12.26/04/2026, TANGGAL 08 APRIL 2026
KONTRAKTOR PELAKSANA : **CV. SATRIA ADITYATAMA**
NILAI KONTRAK : Rp. 106.004.001,00
WAKTU PELAKSANAAN : 35 (TIGA PULUH LIMA) HARI KALENDER

HARI		RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA
CUACA	BAIK	√	√	√	√	√	√	√
	HUJAN							
JUMLAH JAM KERJA		8	8	8	8	8	8	8
1.	SITE MANAGER							
2.	PELAKSANA	1	1	1	1		1	1
3.	MANDOR	1	1	1	1	1	1	1
4.	LOGISTIK/ADMINISTRASI							
5.	KEPALA TUKANG							
6.	TUKANG BATU							
7.	TUKANG KAYU							
8.	TUKANG CAT							
9.	TUKANG INTERIOR	3	3	3	3	3	3	3
10	TUKANG BESI							
11	TUKANG LISTRIK							
12	PEMBANTU TUKANG							
13	KEAMANAN PROYEK							
	JUMLAH	5	5	5	5	4	5	5

Dibuat oleh :
Nama : NOVI RATNASARI
Jabatan : PELAKSANA
Kontraktor : CV. SATRIA ADITYATAMA

CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU

T.Tangan : .....

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : RABU Tgl : 29 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	5	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1	LEM TACO	10	Kg
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PASANGAN LANTAI VINYL

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : KAMIS Tgl : 30 - 04 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	5	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PASANGAN LANTAI VINYL

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : JUM'AT Tgl : 01 - 05 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	5	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PEMBUATAN RANGKA RAK-RAKAN BACKDROP

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : SABTU Tgl : 02 - 05 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	5	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PEMBUATAN RANGKA RAK-RAKAN BACKDROP
- PEKERJAAN PEMBUATAN PINTU HPL

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : MINGGU Tgl : 03 - 05 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana		Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	4	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PEMBUATAN RANGKA RAK-RAKAN BACKDROP
- PEKERJAAN PEMBUATAN PINTU HPL

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : SENIN Tgl : 04 - 05 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	5	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN PASANGAN PINTU
- PEKERJAAN RESINE FINISHING HPL

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

	LAPORAN HARIAN	LEMBAR :
Kontraktor Pelaksana CV. SATRIA ADITYATAMA BANJARBARU	INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR KALIMANTAN SELATAN LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA	Hari : SELASA Tgl : 05 - 05 - 2026

TENAGA KERJA

No.	Keahlian	Jumlah	Satuan
1	Site Manager		Orang
2	Pelaksana	1	Orang
3	Mandor	1	Orang
4	Logistik / Administrasi		Orang
5	Kepala tukang		Orang
6	Tukang batu		Orang
7	Tukang kayu		Orang
8	Tukang cat		Orang
9	Tukang INTERIOR	3	Orang
10	Tukang Besi		Orang
11	Tukang listrik		Orang
12	Pembantu Tukang		Orang
13	Keamanan proyek		Orang
14	Jumlah tenaga kerja	5	Orang

DAFTAR MATERIAL MASUK

No.	Jenis Bahan	Volume	Satuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KONDISI CUACA

Keadaan Cuaca	Jumlah Jam Kerja
Hujan :	Kerja Normal : 8 JAM
Gerimis :	Kerja Lembur :
Cerah :	Total Jam Kerja :

PERALATAN KERJA / BAHAN KERJA

No.	Jenis Alat	Volume	Satuan
1	SCHAFOLDING	2	SET
2	ALAT TUKANG KAYU	1	SET
3			
4			
5			
6			

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- PEKERJAAN RESINE FINISHING HPL

- PEKERJAAN RESINE FINISHING HPL

CATATAN PENGAWAS

Kontraktor Pelaksana
CV. SATRIA ADITYATAMA

NOVI RATNASARI
Pelaksana Lapangan

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4, MENTAOS, BANJARBARU UTARA, KOTA BANJARBARU 70714
TELEPON. (0511) 4772346, FAXIMILI (0511) 4781810
WEBSITE : www.kalsel.brmp.pertanian.go.id

POTO
DOKUMENTASI

Nomor Kontrak ;
Nomor : B-162/PL.020/H.12.26/04/2026

Nama Paket Pekerjaan :
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Ruang AOR
BRMP Kalimantan Selatan

Lokasi Pekerjaan ;
Jalan Panglima Batur Barat No. 4 Mentaos Banjarbaru Utara

Tahun Anggaran 2026

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. SATRIA ADITYATAMA
BANJARBARU
BANK BPD Kalsel. Cab. Banjarbaru
NPWP 03.108.399.0-732.000
Jl. Hercules Km. 25 No. 13 RT. 002 RW. 007 Landasan Ulin Timur Banjarbaru 70724 Telp. (0511) 7676603
Akte Notaris : Noor Hasanah, SH. No. 299 Tgl. 14 Juli 2010

FOTO DOKUMENTASI

KEMENTERIAN PERTANIAN

INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR BRMP KALSEL

LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA



Pek. Pembongkaran Plafond



Pek. Pembongkaran Plafond

FOTO DOKUMENTASI

KEMENTERIAN PERTANIAN


INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR BRMP KALSEL

LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA



Pek. Pembongkaran Rangka Plafond

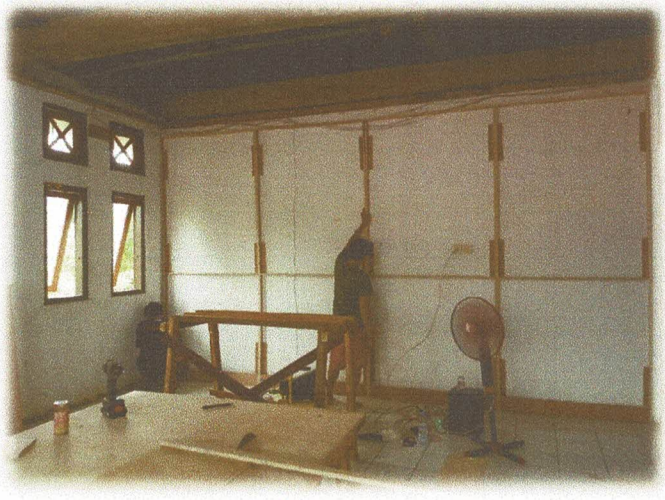

Pek. Pemasangan rangka dinding plywood 15mm

FOTO DOKUMENTASI

KEMENTERIAN PERTANIAN

INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR BRMP KALSEL

LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA



Pek. Pasangan Peredam Suara dengan Glasswool / Rockwool density 60kg/cm3



Pek. Pasangan Peredam Suara dengan Glasswool / Rockwool density 60kg/cm3

FOTO DOKUMENTASI

KEMENTERIAN PERTANIAN

INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR BRMP KALSEL

LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA



Pek. Pasangan hpl hitam untuk lis bagian bawah dinding



Pek. Penutupan jendela dengan plywood 9mm

FOTO DOKUMENTASI

KEMENTERIAN PERTANIAN

INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR BRMP KALSEL

LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA



Pek. Pasangan Rangka Plafond Hollo metal furing
dan Plafond Gypsum board 9mm



Pek. Pasangan Rangka Plafond Hollo metal furing
dan Plafond Gypsum board 9mm

FOTO DOKUMENTASI

KEMENTERIAN PERTANIAN

INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR BRMP KALSEL

LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA



Pek. Compound Plafond Gypsum board 9mm



Pek. Cat Plafond Gypsum board

FOTO DOKUMENTASI

KEMENTERIAN PERTANIAN

INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR BRMP KALSEL

LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA



Pek. Pasangan HPL Motif



Pek. Pasangan HPL Motif

FOTO DOKUMENTASI

KEMENTERIAN PERTANIAN

INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR BRMP KALSEL

LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA



Pek. Pasangan Backdrop UV Marble Motif



Pek. Pasangan Lantai Vinyl 3mm Motif

FOTO DOKUMENTASI

KEMENTERIAN PERTANIAN

INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR BRMP KALSEL

LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA



Pek. Finishing hpl Resine



Pek. Finishing hpl Resine

FOTO DOKUMENTASI

KEMENTERIAN PERTANIAN


INSTANSI : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN RUANG AOR BRMP KALSEL

LOKASI : JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4 MENTAOS BANJARBARU UTARA



Tampak 100% Ruang AOR

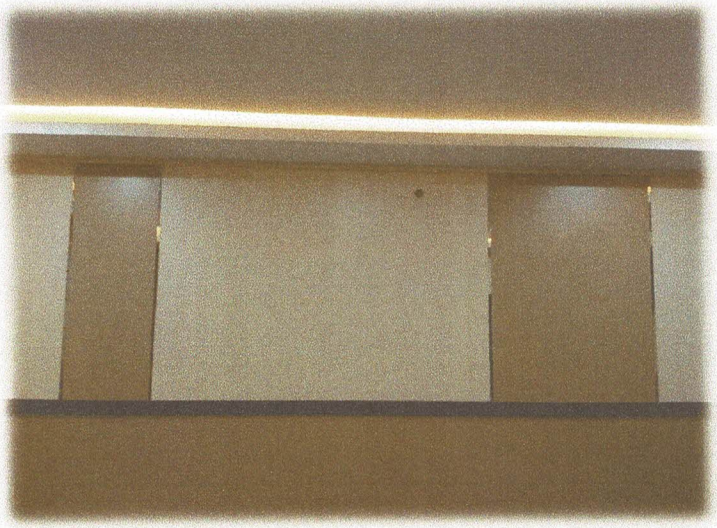

Tampak 100% Ruang AOR
